

まちづくり交付金 事後評価シート
西谷地区

平成18年12月



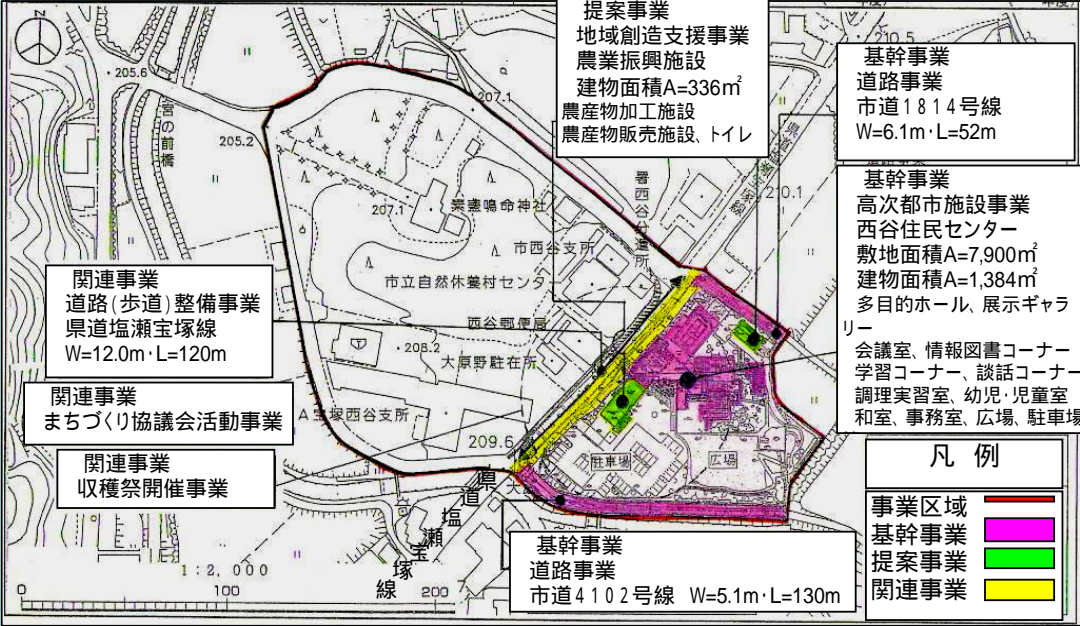


兵庫県宝塚市

様式2 - 1 評価結果のまとめ

都道府県名	兵庫県	市町村名	宝塚市	地区名	西谷地区
計画期間	平成16年度～平成17年度	まちづくり交付金交付期間	平成16年～平成17年		
モニタリング実施時期	-	事後評価実施時期	平成18年11月	フォローアップ実施時期	-

1) 事業の実施状況	当初計画どおり実施した事業	道路(市道1814号線)(県道塩瀬宝塚線から地域交流センター北側への連絡道路)、道路(市道4102号線)(地域交流センター南側に隣接する道路)、農業振興施設(地域創造支援事業)(機能;農産物加工施設、農産物販売施設)							
	当初計画から変更した事業(変更した内容)	地域交流センター(高次都市施設)(機能;地域利用施設、児童館等;機能を満足する範囲内で規模の(縮小A=1,500㎡ A=1,384㎡)							
	変更した理由、目標・数値指標への影響等								
2) 都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況	指標		単位	達成度			達成見込みの有無	効果発現要因	
	指標1	まちづくり活動参加者数	(人/年)	モニタリング	事後評価	フォローアップ	あり	なし	総合所見
	指標2	来訪者数	(人/年)						地域交流センターの整備により、既存施設を含めた年間のまちづくり活動参加者数が30,519人(従前値(H15)8,300人、目標値12,500人)に増加し、交流活動が促進された。
3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値		数値		効果発現要因	
	その他の数値指標1	地域交流センターにおける年間行事開催数	回	0	H15	モニタリング	事後評価	フォローアップ	総合所見
	その他の数値指標2	農業振興施設出品等参加者数	人	0	H15		99		地域交流センターにおいて、映画会、スポーツ会などの行事が開催され、多世代の交流活動が促進された。また、行事には市南部の市民の参加もあり、地域内外の交流も促進されている。
	その他の数値指標3	創出雇用者数	人	0	H15		98		農業振興施設の整備に伴い、加工グループや生産農家が野菜等の出品に参加し、地域農業の振興が促進されている。
	その他の数値指標4	西谷地域以外からの来訪者割合	%	-	-		7	96.3	地域交流センターは地元NPOが、農業振興施設はJAが指定管理者となり、それぞれ地域住民が従事し、管理運営が行われている。
4) 定量的に表現できない定性的な効果発現状況									
5) 実施過程の評価	評価項目	実施内容	実施状況				今後の対応方針等		
	モニタリング		当初計画に予定なく、実施していない。						
	住民参加プロセス	(仮称)西谷住民センター建設運営検討会議を実施した。	予定どおり実施できた	予定していなかったが実施した	予定したが実施しなかった・できなかった	地域交流センターを拠点として、住民によるまちづくり活動がより一層活性化されるよう支援していく。			
	持続的なまちづくり	西谷地域の住民をメンバーとするNPOによる、施設の管理を実施。	予定どおり構築できた	予定していなかったが構築した	予定したが構築しなかった・できなかった	西谷地域の住民をメンバーとする特定非営利活動法人宝塚NISITANIが、地域利用施設等の指定管理者となって管理を行っている。			

様式2-2 まちづくり交付金の成果及び今後のまちづくり

西谷地区(兵庫県宝塚市) まちづくり交付金の成果概要					
まちづくりの目標	交流(人・世代・地域・自然・農業)による地域力の再生	まちづくり交付金の代表的成果	まちづくり活動参加者数 (人/年)	8,300(H15)	30,519(H18)
			来訪者数 (人/年)	2,000(H15)	59,247(H18)
 <p>農業振興施設</p>  <p>市道4102号線</p>		 <p>提案事業 地域創造支援事業 農業振興施設 建物面積A=336㎡ 農産物加工施設 農産物販売施設、トイレ</p> <p>基幹事業 道路事業 市道1814号線 W=6.1m・L=52m</p> <p>基幹事業 高次都市施設事業 西谷住民センター 敷地面積A=7,900㎡ 建物面積A=1,384㎡ 多目的ホール、展示ギャラリー 会議室、情報図書コーナー 学習コーナー、談話コーナー 調理実習室、幼児・児童室 和室、事務室、広場、駐車場</p> <p>凡例 事業区域 基幹事業 提案事業 関連事業</p> <p>関連事業 道路(歩道)整備事業 県道塩瀬宝塚線 W=12.0m・L=120m</p> <p>関連事業 まちづくり協議会活動事業</p> <p>関連事業 収穫祭開催事業</p> <p>基幹事業 道路事業 市道4102号線 W=5.1m・L=130m</p>		 <p>市道1814号線</p>  <p>地域交流センター</p>	
今後のまちづくりの方策 (改善策を含む)		<p>【地域交流の促進】 地域交流センターや農業振興施設を拠点に、長谷牡丹園、少年自然の家、JA支所等周辺に点在する既存施設や、新たに計画されている阪神野外CSR施設等と連携し、自然や農業等地域の特性を活かしたまちづくりを進め、西谷地域全体として、住民や近隣都市住民との交流活動を一層促進する。なかでも、宝塚南部市街地市民との交流をより一層充実する。</p> <p>【特産品の開発】 西谷地域においては、ダリアや栗、黒大豆等特色ある農産物が生産されている。また、今回整備した農業振興施設においては米粉パン等が開発され好評を得ている。このような地域の農産物を活かした特産品の開発を支援し、地域の魅力の向上と産業振興を図る。</p> <p>【情報発信の拠点としての機能の充実】 地域交流センター、農業振興施設および既存の市立自然休養村センターを西谷地域全体の中核として、情報受発信の中核機能を充実させていく。</p> <p>【交通機能の充実】 地域内外における交流活動の一層の促進を図るため、道路や歩道の改良、パスイの充実など交通システムの整備を進める。</p>			
